Comune di Neoneli

Provincia di Oristano

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

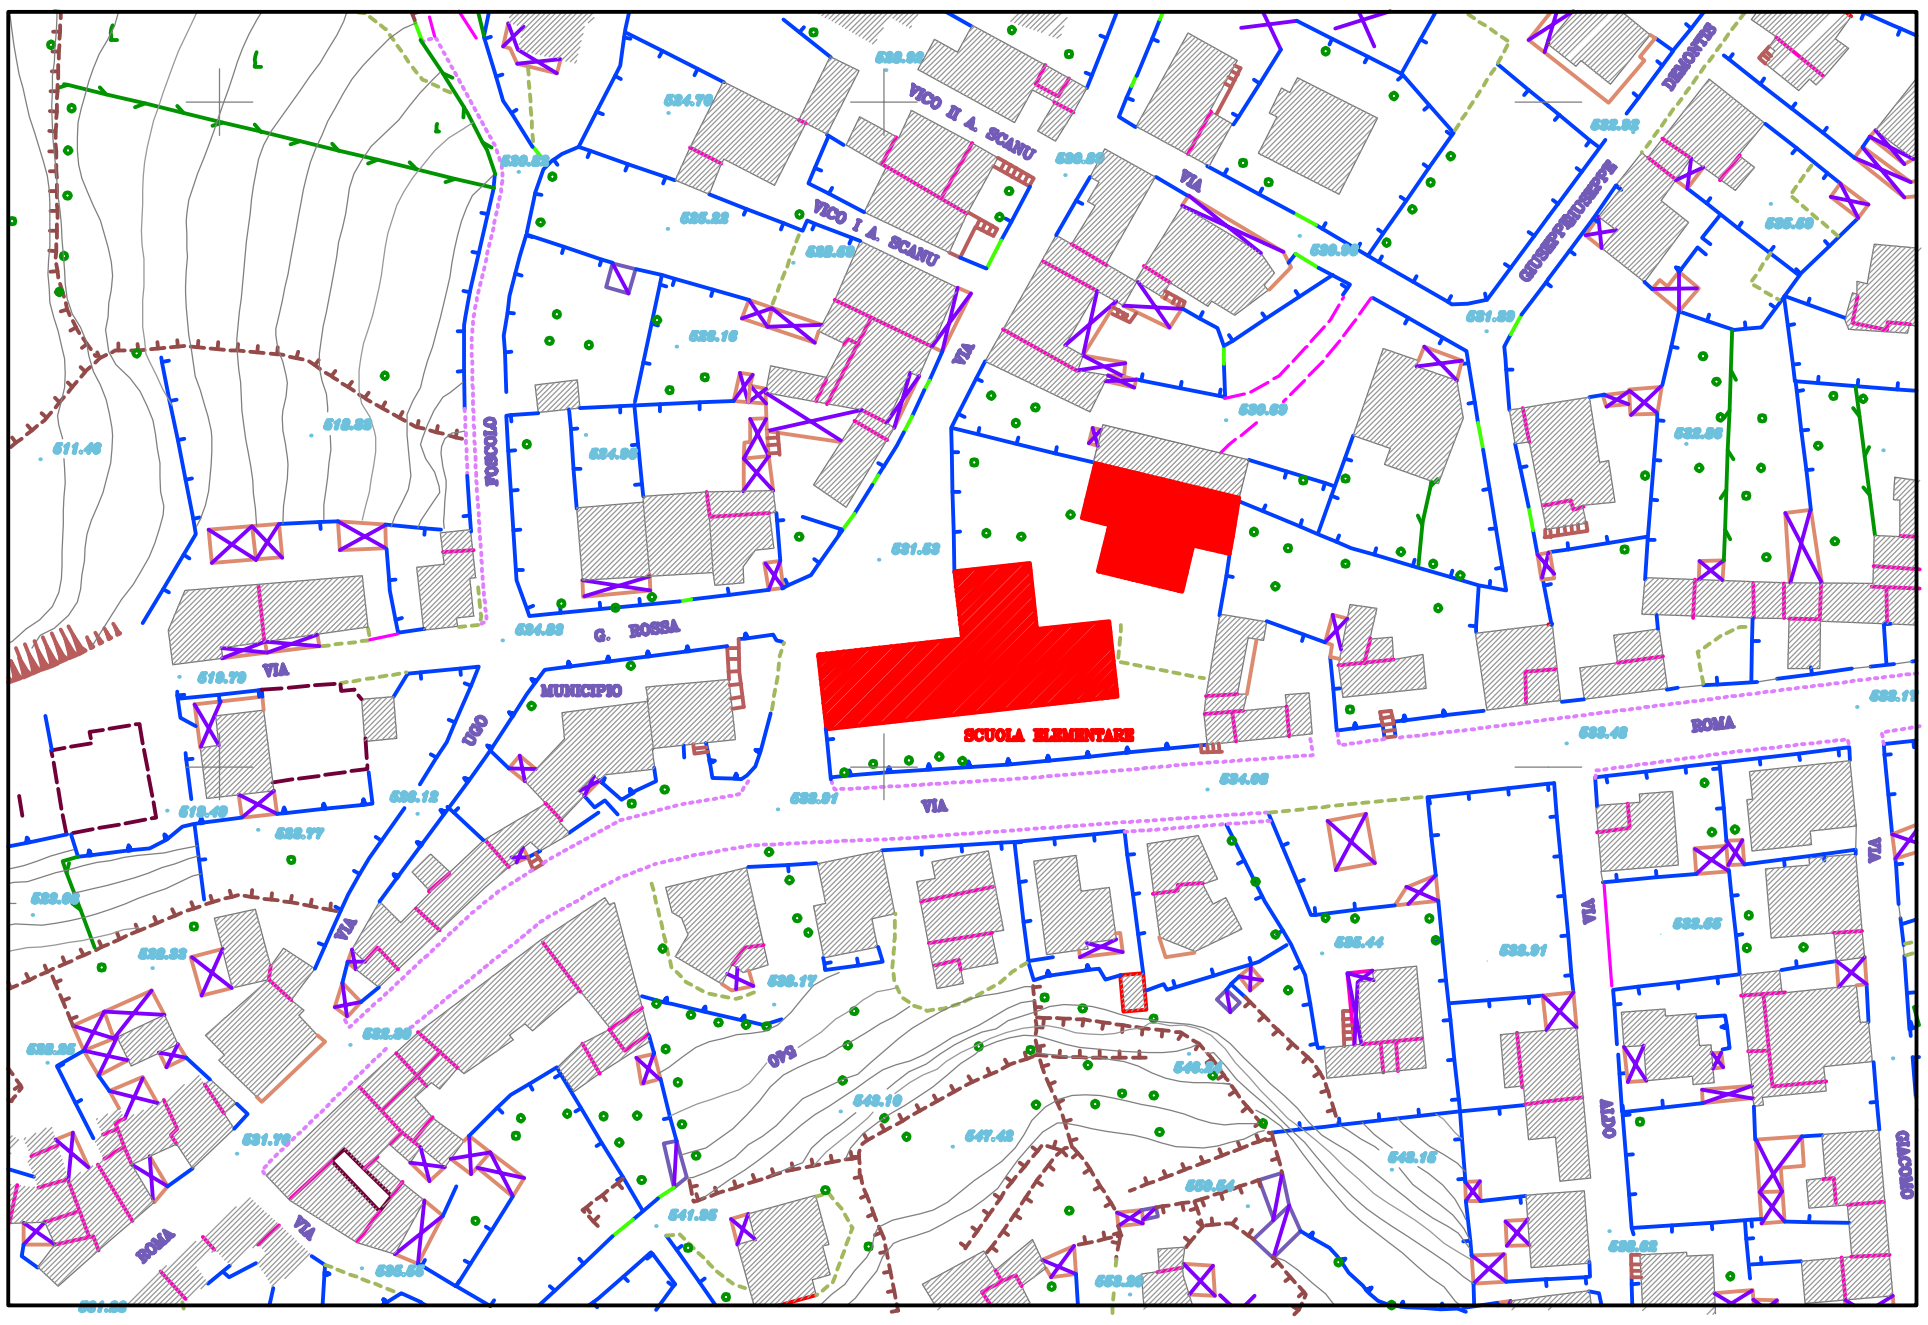

PROGETTO ESECUTIVO

Il R.U.P.: Geom. Gianfranco Urru	Titolo: *Cronoprogramma*	
Il Progettista: Dott. Ing. Serafino Piras	Prot:	Elaborato: 9
	Data:	

STUDIO PROFESSIONALE Dott. Ing. Serafino Piras via Avv. Piero Sanna 7, 09074 Ghilarzal (OR) tel 328.6764323 e-mail ing.serafinopiras@alice.it

COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

CRONOPROGRAMMA
PROGETTO ESECUTIVO

1. Generalità

Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, è stato redatto ai sensi dell'art. 40 del ripetuto D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Il cronoprogramma prende in considerazione le problematiche inerenti la sicurezza come indicato nel p.to 2.3 del allegato XV del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81.

2. Tempi di esecuzione

Uno degli obbiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione dei lavori. Dai calcoli e dalle previsioni effettuate è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.
Per il calcolo dei giorni necessari per eseguire le lavorazione si è tenuto conto dei motivi di sicurezza legata all'interferenza generata per la presenza degli alunni, la difficoltà di approvvigionamento di materiali e di apparecchiature specie quelle ad alto contenuto tecnologico non disponibili sul mercato per via dell'insularità della Regione. Si è, inoltre,

tenuto conto delle possibili condizioni meteorologiche sfavorevoli così come previsto dal c.3 dell'art 40 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Il cronoprogramma potrà subire variazioni in funzione del periodo nel quale vengono appaltati i lavori e con la sovrapposizione dell'attività didattica.

3. Produzione settimanale

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione settimanale media tale da potere realizzare la quantità di lavorazioni corrispondente all'importo complessivi stabilito.

Neoneli, lì 18/11/2013

Il Professionista
Dott. Ing. Serafino Piras

COMUNE DI NEONELI

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLAS

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA DEI LAVORI 180 Giorni naturali e consecutivi

	LAVORAZIONI	I°				II°				III°				IV°				V°				VI°				IMPORTO
	Allestimento del cantiere																									
OG 1	Sistemazione copertura piana																									27 268,45
OG 1	Sistemazione copertura inclinata																									18 291,84
OG 1	Movimento terra																									9 515,75
OG 1	Sistemazione piazzale																									35 360,52
OG 1	Realizzazione tribuna																									5 271,75
OG 1	Intonaco e tinteggiatura																									5 105,08
OG 1	Manto sportivo																									27 202,00
OG 1	Illuminazione esterna																									4 580,00
OG 1	Sostituzione Bruciatore																									2 990,00
OG 1	Scavo colleg. serbatoi gasolio																									1 304,59
OG 1	Attrezzatura Sportiva																									6 690,00
	Pulizia e chisura cantiere																									
	arrotondamento																									0,02
																									Oneri per la sicurezza	1 420,00
	TOTALE																									**145 000,00**

Neoneli, lì 18/11/2013

Il professionista
Dott. Ing. Serafino Piras
